

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ PROSTĚJOV

KLIMATICKO – ENERGETICKÝ MANAGEMENT PRO MĚSTA A OBCE 1.7.2021


PROSTĚJOV V DATECH



PROSTĚJOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO

- 45 tis obyvatel
- 21 organizací ve správě
- 520 odběrných míst
- zavedený systém hospodaření s energiemi – EM
- spolupráce s PO – osvěta, vzdělávání
- strategický dokument Smart Prostějov – nový strategický plán města

FVE SPORTCENTRUM DDM – VYUŽITÍ OZE

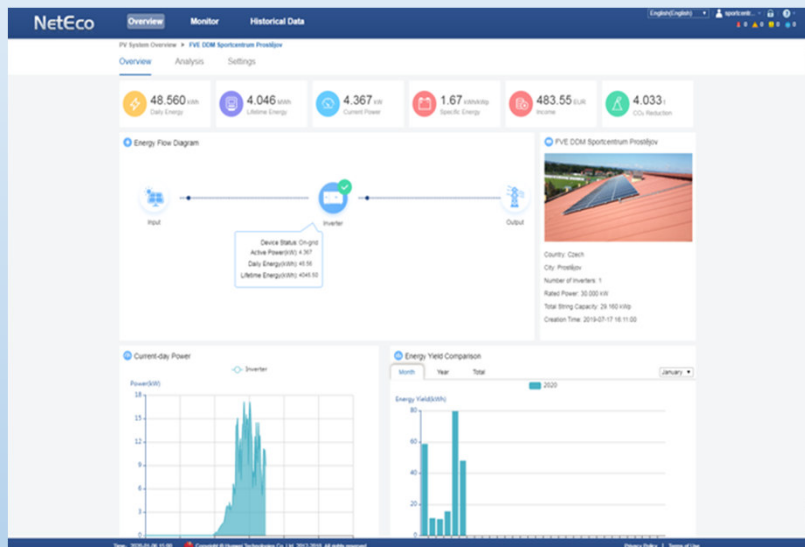

Výkon FVE 29,16 kWp

Počet modulů: 108, výkon panelu 270Wp

Náklady: 817 000,- Kč včetně DPH

Vyrobena energie k 17.6.2021: 53,7MWh

Úspora CO₂: 53,4 t

Virtualizační panel

Uvedení do provozu: 10.10.2019

FVE SPORTCENTRUM DDM – VYUŽITÍ OZE

- Plánování investiční akce v rozpočtu obce (PD/realizace)
- Realizace ve spolupráci s ORI + dotčená PO (svěřený majetek)
- Dotace (splnění podmínek)
- Vytipování vhodného objektu (provoz, spotřeby, památkáři)
- Nutná prohlídka objektu a stávajícího OM (možné vícenáklady na úpravu OM)

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV – PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA

- ROZOP na zpracování PD (6.2.2018), objednávka PD (16.5.2018)
- Zpracování PD pro stavební povolení, včetně statického posudku 20.9.2018 (autorizace pro statiku a dynamiku staveb) a požárně bezpečnostního řešení stavby (cena 50 tis včetně DPH)
- Žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany pro vydání stavebního povolení (09/2018) – první nesouhlasné (TOTAL STOP, CENTRAL STOP) souhlasné stanovisko uděleno 17.12.2018
- Žádost o stavební povolení (20.12.2018) / památková péče
- Vydání stavebního povolení (15.1.2019)
- Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení NN (9.4.2019)
- Žádost o smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k DS z napěťové hladiny NN - distributor (specifikace připojení, přidělení výrobního EAN) (23.4.2019)

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV


- Položkový rozpočet, zpracování veřejné zakázky, vypsání VŘ (05/2019)
- Podpis smlouvy o dílo (28.6.2019)
- Žádost o udělení výjimky z umístění měření (19.7.2019)
- Realizace stavby (2 dny 19.7.2019)
- Úprava odběrného místa (dát do požadavků + prohlídka objektu v rámci VŘ)
- Souhlasné závazné stanovisko HZS k užívání stavby (12.9.2019)
- Kolaudace stavby a kolaudační souhlas s užíváním stavby (12.9.2019)
- Žádost o první paralelní připojení výroby k DS (26.9.2019)
- Uzavření smlouvy na výkup EE (3.10.2019)
- Termín prvního paralelního připojení a uvedení do provozu 10.10.2019
- Registrace u OTE (do 30 dnů), aktualizace PENB

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV

- žádost o udělení licence ERU (19.9.2019)

- Žádost o udělení licence + kolek 1000 Kč
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Předávací protokol o převzetí majetku – notářsky ověřeno
- Jmenování do funkce
- Zřizovací listina + dodatek č. 5 Kolaudační souhlas
- Katastrální mapa
- Seznam provozoven
- Ustanovení odpovědného zástupce
- Prohlášení odpovědného zástupce
- Osvědčení vyhl. č. 50/1978 o odborné způsobilosti – notářsky ověřeno
- Vysvědčení o maturitní zkoušce – notářsky ověřeno
- Údaje pro informace z Rejstříku trestů
- Revizní zpráva
- **Licence udělena 4.10.2019**

VÝROBA FVE – 06/2021

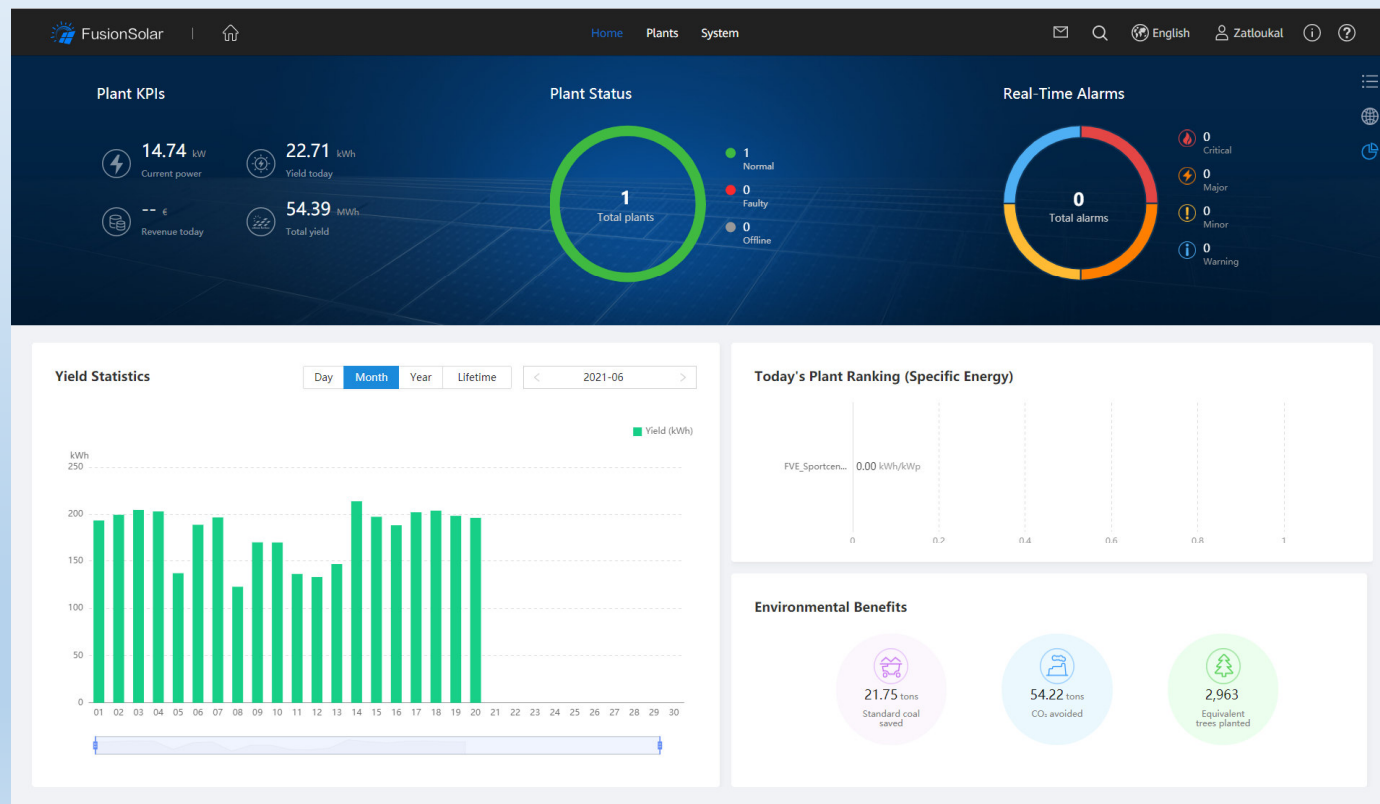

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Kontakt: **Ing. Kateřina Vosičková**

katerina.vosickova@prostejov.eu

+420 733 614 417, 582 329 177
